



ALHEEMBOUW

Coldo hoogbouw Kuurne

ALHEEMBOUW

WAB002624

Coldo hoogbouw Kuurne

Versie 1



ALHEEMBOUW

Alheembouw NV

Roeselarestraat 205
8840 Oostnieuwkerke
+32 (0)51 22 15 86
info@alheembouw.be

Versies				
Datum	Versie	Status	Auteur	Revisor
18/07/2024	1	Vrijgegeven	DE DONCKER Ellen	



ALHEEMBOUW



Interne betrokkenen				
Rol	Naam	E-mail	GSM	
Beheerder	VANYSACKER Toon	toon.vanysacker@alheembouw.be	+32 479/95.92.96	
Directeur	VANDENBERGHE Piet	piet.vandenbergh@alheembouw.be	+32 470/20.85.83	
Geïnspecteerde	COSSEMENT Maxim	maxim.cossement@alheembouw.be	+32 478/70.02.41	
VG functionaris	VANYSACKER Toon	toon.vanysacker@alheembouw.be	+32 479/95.92.96	
Verantwoordelijke	VANYSACKER Toon	toon.vanysacker@alheembouw.be	+32 479/95.92.96	
Administrateur	VANDENBULCKE An	an.vandenbulcke@alheembouw.be	+32 471/03.99.16	
Auteur	DE DONCKER Ellen			
Externe betrokkenen				
Rol	Bedrijfscontact	Contactpersoon	E-mail	GSM/Telefoon
Overheid	Directie West-Vlaanderen	Directie West-Vlaanderen	twv.west-vlaanderen@werk.belgie.be	02/233.42.40
Veiligheidscoördinator	Feys BVBA			+32 57 33 27 18
Klant	Coldo		info@coldo.be	+32 56 89 29 93
Veiligheidscoördinator ontwerp	Feys BV			057/33 27 18
Veiligheidscoördinator verwezenlijking	Feys BV			057/33 27 18
Ziekenhuis	AZ GROENINGE			056 63 63 63

ALHEEMBOUW



1. WERFGEGEVENS

Naam: Coldo hoogbouw Kuurne
Dossiernummer: WAB002624
Straat: Noordlaan 7 Kuurne

Startdatum: 09/09/2024
Einddatum: 28/02/2026

Aantal werknemers op de werf: 2 minimum
120 maximum

Veiligheidscoördinator: Feys BVBA

ALHEEMBOUW



2. GEGEVENS BETREFFENDE DE ONDERNEMING

Alheembouw NV
Roeselarestraat 205
8840 Oostnieuwkerke
Bouwbedrijf klasse 8

Gedelegeerd bestuurder:
Diensthoofd IDPBW:
Preventieadviseur - milieu:
Projectleider:
Werfleider:
Veiligheidsverantwoordelijke op de werf:
E.H.B.O. op de werf:

TEMMERMAN Peter
SAMAHEY Marc
VANDENBULCKE An
VANYSACKER Toon
COSSEMENT Maxim
VANYSACKER Toon
De werfleider

Arbeidsongevallenverzekeraar:

De Federale Verzekeringen
Stoofstraat 12
B 1000 Brussel
Tel: +32 2/509.04.11

Externe dienst voor preventie
en bescherming op het werk:


Attentia
Sluisweg 1 bus 2
B 9000 Gent
Tel: +32 9/243.40.21

Keuring heftoestellen:

BTI
Derbystraat 345 - Maaltecenter
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: +32 9 242 92 00

3. WERFMATERIEEL

3.1. WERFINRICHTING

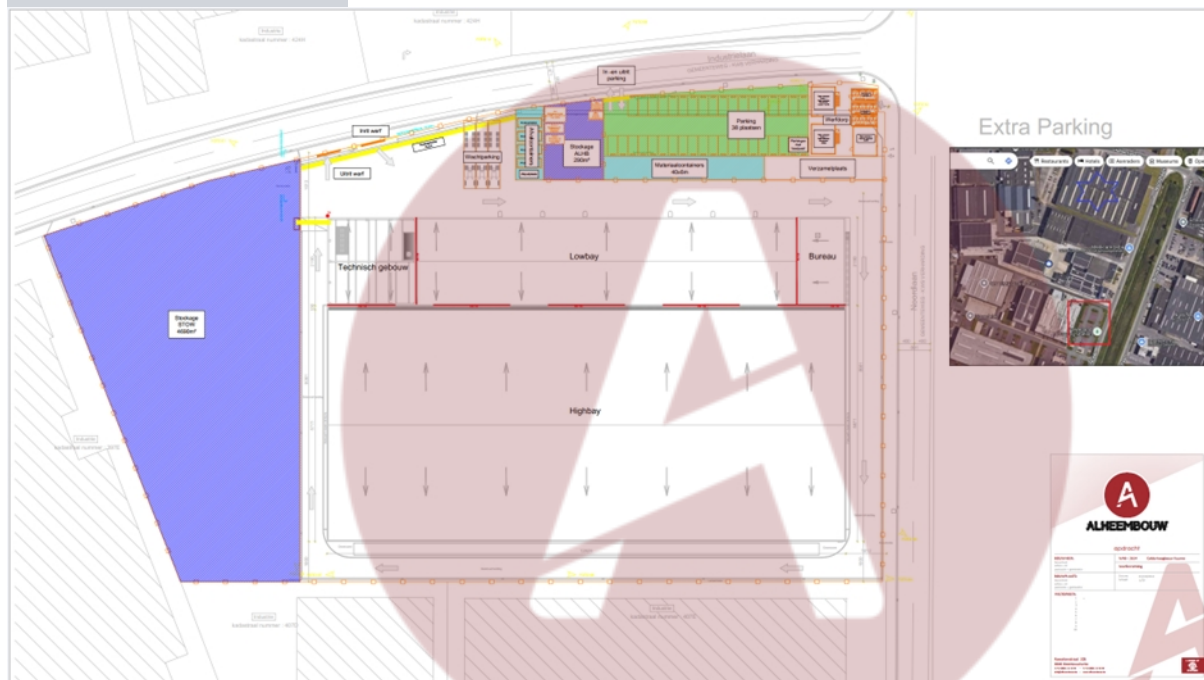

Eetcontainers en kledruimte

Bureelcontainers

Sanitaire voorzieningen

Materiaalcontainers

Afvalcontainers

Stockagezone bouwmaterialen

Parkeerzone

Werfborden en signalisatie

Werfmelding

Locatie noodvoorzieningen en noodprocedures

Een werfinrichtingsplan is beschikbaar

Omgevingsvergunning werfinrichting opslag gevaarlijke producten



3.2. ELEKTRISCH MATERIAAL

Elektrisch materiaal wordt periodiek onderhouden en gekeurd
Kabels van het type HO7RN-F
Beschermingsgraad IP44 spatwaterdicht

3.3. ARBEIDSMIDDELEN

Elektrisch handgereedschap (boormachine, pikeerhamer, haakse slijper e.d.).
Schoren, ladders, steigers, trappentoren, randbeveiliging.
Alle arbeidsmiddelen worden periodiek onderhouden en gelabeld.
De hef- en hijstoestellen en het aanslagmateriaal worden periodiek gekeurd.
Na keuring wordt gelabeld met een kleurcode en datum.

3.4. GEVAARLIJKE PRODUCTEN

Acetyleen
Aspen
Benzine
Cement
Diesel
Hilti HIT 200
Hilti HIT-RE 500
Marginel
Peri-bioclean
PU Foam
PU Gun en cleaner
Verfspuitbus
Zuurstof

Van alle producten zijn de SDS-fiches en de veiligheidsinstructiekaarten (VIK) beschikbaar.



3.5. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Veiligheidshelm



Veiligheidsschoenen



Werkkledij



Fluorescerende signalisatie kledij



Andere persoonlijke beschermingsmiddelen i.f.v.het risico

3.6. NOODVOORZIENINGEN

EHBO-koffer: jaarlijks nazicht

Brandblusapparaten: jaarlijks onderhoud

Lekbakken gevaarlijke producten

Spill-kit voor de opvang van gemorste vloeistoffen

Noodvoorzieningen i.f.v. van werfomvang



4. PROCEDURES

4.1. WERFONTHAAL

Alle medewerkers op de werf dienen zich aan te melden.

Werfeigen startinstructies worden toegelicht en een competentie/opleidingslijst wordt ingevuld. De medewerker tekent voor akkoord

Een onthaalbrochure voor de onderaannemer is beschikbaar.

4.2. CHECK IN AT WORK

Alle werfmedewerkers worden geregistreerd in checkin@work

Deze registratielijst wordt dagelijks door de werfleiding geverifieerd

4.3. TOOLBOXMEETINGS

Maandelijks geeft de hiërarchische lijn op de werf een toolboxmeeting m.b.t. arbeidsongevallen, incidenten en safetystops

I.f.v. de bouwfase worden bijkomende toolboxmeetings gegeven

De aanwezigheid op de toolboxmeetings wordt geregistreerd

4.4. INTERNE PROCEDURE MELDINGEN

Arbeidsongevallen, incidenten, safetystops, schadegevallen en kwaliteitsitems worden via de Vario Mobile-app gemeld en geregistreerd voor verdere opvolging



4.5. WERFTOEZICHT

Dagelijks houdt de hiërarchische lijn veiligheidstoezicht.

Periodiek worden door medewerkers van de preventiedienst en de directie werfinspecties uitgevoerd om de hiërarchische lijn bij te staan. De rapporten van de werfinspecties worden digitaal opgevolgd.

4.6. PROJECTSPECIEKE AFSPRAKEN / PROCEDURES

Het project bevindt zich in een militaire zone welke gebruikt wordt voor zeer lage trainingsvluchten met helikopters.

Bebakening van het ganse project (tijdelijke werfkranen en dergelijke en eventuele bliksemafleiders inclusief) is vereist vanaf dat het obstakel een totale hoogte bereikt van $\approx 25\text{m}$ boven het grondniveau voor wat betreft nachtbebakening en $\approx 57\text{m}$ boven grondniveau voor wat betreft dagbebakening.

De bebakening dient conform te zijn met de normen vastgelegd middels de circulaire GDF-03 voor het grondgebied van categorie C. (<https://mobilit.belgium.be/nl/publications/circulaire-gdf-03>).

Gezien de gevraagde hoogte van 45m AGL dient een nachtbebakening te worden aangebracht.

4.7. INTENTIEVERKLARING ONDERAANNEMERS

Onderaannemers van Alheembouw ontvangen bij bestelling het algemeen veiligheidsgezondheidsplan van de veiligheidscoördinator, het bouwplaatsreglement, de procedure werken met derden (indien van toepassing) en het kwaliteitsveiligheidsplan met risicoanalyse van Alheembouw.

Voorafgaand de werken te starten maakt de onderaannemer voor zijn activiteiten een kwaliteitsveiligheidsplan en een risicoanalyse over aan Alheembouw.

Alheembouw ontvangt van betrokken onderaannemer de intentieverklaring waarin verklaart wordt de bovenvermelde documenten te hebben ontvangen en dat men akkoord gaat met de geldende veiligheidsvoorschriften.



5. IDENTIFICATIE VAN DE CONTROLEORGANISMEN

Keuring heftoestellen:

BTI
Derbystraat 345 - Maaltecenter
9051 Sint-Denijs-Westrem
TEL +32 9 242 92 00

CONSTRUCTIV:

Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel
TEL +32 2 209 65 65

FOD - Externe directies Toezicht
op het welzijn op het werk:

Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal
overleg
Directie West-Vlaanderen
Koning Albertlaan 1-5 bus 4 (FAC Kamgebouw) - 8200 Brugge
02/233.42.40
tww.west-vlaanderen@werk.belgie.be

Federale overheidsdienst sociale zekerheid:

Administratief Centrum Kruidtuin
Finance tower
Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
TEL +32 2 528 60 11

Wachtdienst Regionaal Toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk:
+32 2 235 53 00

ALHEEMBOUW



6. NOODSITUATIES

6.1. WATTE DOEN BIJ EEN ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL?

1. EERSTE ZORGEN

- Ontleed de situatie vooraleer u naar het slachtoffer gaat
- Aandacht voor eigen welzijn. Breng uzelf niet in gevaar
- Identificeer alle nog aanwezige en niet zichtbare risico's: omvallen van obstakels, elektrisering en/ of elektrocutie, brand, explosie, verstikking, verdrinking
- Dien de eerste zorgen toe: slachtoffer: niet laten drinken en warm houden

2. HANDEL EN BLIJF KALM

- Bel 112 of noodnummer bouwheer
- Vermeld: jouw naam en firmanaam, naam van de werf, straat van de werf, plaats van de werf
- Omschrijf: aard van het ongeval, exacte plaats van het ongeval (verdieping, put, open vlakte, moeilijk toegankelijk, dak, ...), aantal gewonden en hun toestand, of het noodzakelijk is te evacueren
- Hang niet als eerste op
- Verwittig Alheembouw ploegbaas / werfleiding / projectleider
- Bel preventiedienst Alheembouw: An Vandenbulcke +32 471/03.99.16 of Charlotte Verfaillie +32 471/63.04.27

3. EVACUATIE/OPVANG HULPDIENTEN

- Aanwezigen op de werf verzamelen op de verzamelplaats
- Vang aangeslagen werkkrachten op
- Hulpdiensten opvangen = stuur iemand naar de ingang van de werf om hulpdiensten te begeleiden. Op sommige werven kan dit door de bouwheer voorzien worden

4. AFVOEREN SLACHTOFFER

- Medisch attest meegeven uit verbandkoffer



6.2. WATTE DOEN BIJ EEN MILIEU INCIDENT?

Voorbeelden:

- *Bodemverontreiniging: lekkende mazout tank, mazout tank lekt in beek, doorboren van mazout tank camion.*
- *Beschadigen van chemische installatie.*
- *Vrijkomen asbest naar de burens.*

HANDEL EN BLIJF KALM

- Ontleed de situatie en bel naar de projectleider
- Aandacht voor eigen welzijn. Breng uzelf niet in gevaar
- Identificeer alle nog aanwezige en niet zichtbare risico's: omvallen van obstakels, elektrisering en/ of elektrocutie, brand, explosie, verstikking, verdrinking, wegvloeien product, vissterfte, ontbladering van de bomen
- Stop de verontreiniging
- Bel Alheembouw: +32 51/22.15.86
- Verwittig bouwheer (door projectleider)
- Antwoord niet op vragen van buitenstaanders (bv pers, burens,...)

Vanuit Alheembouw zullen verdere acties gecoördineerd worden en word je door Alheembouw op de hoogte gebracht van nog te nemen acties.

ALHEEMBOUW



6.3. WATTE DOEN BIJ EEN ERNSTIG INCIDENT?

Voorbeelden:

- *gedeeltelijke instorting gebouw*
- *doorboren van gasleiding*

HANDEL EN BLIJF KALM

- Ontleed de situatie en bel naar de projectleider
- Aandacht voor eigen welzijn. Breng uzelf niet in gevaar
- Identificeer alle nog aanwezige en niet zichtbare risico's: omvallen van obstakels, elektrisering en/ of elektrocutie, brand, explosie, verstikking, verdrinking
- Bel Alheembouw: 051/ 22 15 86
- Verwittig bouwheer (door projectleider)
- Antwoord niet op vragen van buitenstaanders (bv pers, burelen,..)

Vanuit Alheembouw zullen verdere acties gecoördineerd worden en word je door Alheembouw op de hoogte gebracht van nog te nemen acties.

6.4. WATTE DOEN BIJ EEN GASLEK?

- Ontruim de omgeving
- Bel 112 en Fluvius: 0800/ 65 0 65
- Omschrijf aard van het lek en of het noodzakelijk is te evacueren
- Verwittig de projectleider



6.5. WATTE DOEN BIJ BESCHADIGING VAN KABELS?

- Scherm de omgeving van de kabel af
- Meld beschadiging aan leiding of kabel altijd. Het kan zware ongevallen en/of schade veroorzaken
- Herstelling elektrische kabel:
 - **Fluvius: 078/ 35 35 00**
- Herstelling telefoonkabel:
 - **Proximus: 0800/ 91 486**
 - **Telenet: +32 15/666.555**

6.6. WATTE DOEN BIJ EEN WATERLEK?

- Sluit indien mogelijk de waterleiding af
- Herstelling waterleiding:
 - **IWVA : +32 58/533.833**
 - **De Watergroep : +32 2/238.96 99**
 - **Farys : 078/35.35.99**
 - **Water-link: 078/35.35.09**
 - **Pidpa: 0800/90 300**
 - **Vivaqua : +32 2/363.34.11**
 - **Aquawal: +32 81/25.42.30**

6.7. WATTE DOEN BIJ HET OPGRAVEN VAN OBUSSEN (BOMMEN)?

- Contacteer de politie (101)
- De politie contacteert op haar beurt de ontmijningsdienst DOVO
- Informeer de veiligheidscoördinator



6.8. NOODNUMMERS



Dichtstbijzijnde ziekenhuis
AZ GROENINGE
PRESIDENT KENNEDYLAAN 4 - 8500 KORTRIJK
056 63 63 63



Brandweer
112



Ambulance / MUG
112



Politie
101



Antigifcentrum
070/245.245



Ontmijningsdienst DOVO
Via Politie 101



ALHEEMBOUW

Milieu incident
Via Alheembouw: +32 51/22.15.86



Post traumatische begeleiding
Via Alheembouw: +32 51/22.15.86
Post traumatische begeleiding: 0800/11 0 11



7. RISICOANALYSE

De risicoanalyse wordt uitgevoerd volgens de methode van Kinney.

De tabel in bijlage is het resultaat van deze methode.

De letters W, B, E en R:

- W: de waarschijnlijkheidsfactor of de wiskundige kans dat een risico zich voordoet.
- B: de blootstellingsfactor of een idee van de blootstellingsduur aan het risico.
- E: de factor van de ernst of het effect, m.a.w. een aanduiding van de mogelijke schade en gevolgen wanneer het risico zich voordoet.

Risicoklasse R. wordt berekend uit de bovenstaande drie getallen

De waarden die aan de letters W, B en E gegeven worden komen uit volgende tabel:

W = Waarschijnlijkheid		B = Blootstellingsfrequentie		E = Effect of Ernst	
0	Bijna niet denkbaar	1	Minder dan 1 maal per jaar	1	Letsel zonder verlet
0	Praktisch onmogelijk	1	Jaarlijks	3	Letsel met verlet
1	Denkbaar maar onwaarschijnlijk	2	Maandelijks	7	Invaliditeit
1	Mogelijk in grensgevallen	3	Wekelijks	15	Eén dode
3	Ongewoon	6	Dagelijks	40	Meerdere doden
6	Zeer goed mogelijk	10	Voortdurend	-	-
10	Te verwachten	-	-	-	-

Met deze drie cijfers wordt via een berekening de risicoklasse volgens volgende tabel bepaald.

R = Risicoklasse	
Aanvaardbaar risico	< 30
Aandacht vereist	30 - 70
Maatregelen vereist	70 - 200
Directe verbetering vereist	200 - 400
Werkzaamheden stoppen	> 400

**Overzicht bedrijfstaken en risicoanalyses**

Volgorde	Bedrijfstask	Risicoanalyse
1	Werfinrichting	Werfinrichting
2	Milieubeheersing	Milieubeheersing
3	Laden en lossen	Laden en lossen
4	Plaatsen verloren bekisting	Plaatsen verloren bekisting
5	Plaatsen plintbekisting	Plaatsen plintbekisting
6	Plaatsen predallen	Plaatsen predallen
7	Plaatsen prefab balken	Plaatsen prefab balken
8	Plaatsen prefab kolommen	Plaatsen prefab kolommen
9	Plaatsen gewelven	Plaatsen gewelven
10	Plaatsen prefab balkons	Plaatsen prefab balkons
11	Plaatsen prefab trappen	Plaatsen prefab trappen
12	Werken met hoogwerker - schaarlift	Werken met hoogwerker - schaarlift
13	Werken met torenkraan	Werken met torenkraan
14	Werken met hef- en hijstoestellen	Werken met hef- en hijstoestellen
15	Werken met snelmontagekraan	Werken met snelmontagekraan

ALHEEMBOUW



Werfinrichting			
Documentcode	RA23/000001	Workflowstatus	Finaal
Versiedatum	05/01/2023	Risicoanalyseformulenaam	Kinney
Bedrijfstaak	Werfinrichting	Entiteit	
Werkpost		Bedrijfsvestiging	
Functie		Bedrijfsafdeling	
Welzijnsdomein		Project	
Beheerders	DECEUNINCK Miguel		
Omschrijving			

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Plaatsen werfafsluiting	Werfafsluiting	Werfdoorgang onbevoegden	10	6	3	180	Aansluitende werfafsluiting Klemmen afsluiting Werfinrichtingsborden aan werfafsluiting Werftoegangspoort sluiten	0.5	6	3	9
2	Plaatsen werfafsluiting	Werfafsluiting	Omvallen	3	6	3	54	Duurzaam schoren (gebruik stekers / inboren)	0.5	6	3	9
2	Plaatsen sociale voorzieningen	Hijsmateriaal	Materiaalbreuk	6	6	1	36	Gekeurd aanslagmateriaal	0.5	6	1	3
2	Plaatsen sociale voorzieningen	Sanitaire containers	Niet aangepaste inrichting	6	6	1	36	Aantal werfketens, type en inrichting in functie van aanwezige personen Aanvullend chemisch toilet in functie van de bereikbaarheid en afstand tot de toiletcontainer Organisatie onderhoud Stabiele, effen ondergrond Toiletcontainer met stromend water aangesloten op rioleringsnet of met septische tank	0.5	6	1	3



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Verplaatsingen op de werf	Doorgangen	Contact met obstakels en aanrijdingen	3	6	1	18	Aangepaste verlichting Begeleiding werftransport Bewaren vrije doorgangen en signalisatie obstakels Fluokledij Verharding in functie van vervoer en weersomstandigheden Werfinrichtingsplan/verkeersplan Werfsignalisatie parking, verkeer, loszone, werkingszone, afvalcontainers, afschuitplaats beton	0.5	6	1	3
2	Verplaatsingen op de werf	Doorgangen	Snijwonden	3	6	1	18	Afschermen van wapening	0.5	6	1	3
2	Verplaatsingen op de werf	Doorgangen	Struikelen	3	6	1	18	Goed kabelbeheer; kabels uit werkzone/omhoog hangen	0.5	6	1	3
2	Verplaatsingen op de werf	Hoogte	Val van personen	6	3	3	54	Conforme randbeveiliging (kantplank, tussenleuning, bovenleuning) Duurzame afscherming openingen Gebruik loopbruggen met leuning Signalisatie van hoogteverschillen op 1,5m van de rand Vrije trappen met duurzame afscherming	0.5	3	3	4.5
9	Verplaatsingen op de werf	Trappen	Val van personen	6	6	15	540	Stabiele plaatsing met aangepaste hoogte traptreden Trappleuning	0.5	6	15	45
10	Verplaatsingen naar hoogte	Ladder	Val van personen	6	6	15	540	3-Puntsregel respecteren Bij voorkeur met telescopische ladder met toegangsborde, trappentoren, trap bouwlift Intacte ladder Ladder 1m boven uitstapplaats Ladder gebruiken voor kortstondige verplaatsing in hoogte Stabiele plaatsing Verboden te werken op ladder, tenzij kortstondig, niet fysiek belastend en binnen arm bereik	0.5	6	15	45



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
11	Gebruik van elektriciteitsvoorziening en	Elektrische werftoestellen	Elektrisering tot elektrocutie	3	6	15	270	Differentieelinrichting 30mA Draagbare toestellen zijn dubbel geïsoleerd Gebruik industriële verlengkabels type H07RN; stekkers en verdeelkasten IP44 Diameter elektrische leidingen zijn min. 2,5mm ² en max. 40m lang; voorverlichting 1,5mm ² en max. 25m lang Gebruik intact materiaal Gekeurde elektrische installaties Kabelrollen volledig ontrollen Kabels in doorgangen afschermen of ingraven Kabels uit water houden Paddestoelen met ingebouwde differentieel Periodiek onderhoud en keuring Toegankelijkheid stroomkasten enkel voor BA4-BA5 Uitgemeten aardingspennen door bevoegd persoon (weerstand minder dan 30 Ohm) Vergrendeling stroomkasten	0.5	6	15	45
12	Werken in de omgeving van ondergrondse leidingen	Elektrische kabels	Contact met ondergrondse leidingen	6	2	3	36	Controle en signalisatie tracé voor werfaanvang Klipplannen en plan omgevingsleidingen	0.5	2	3	3
13	Werken in de omgeving van ondergrondse leidingen	Elektrische kabels	Onvoorzien contact ondergrondse leidingen	6	2	3	36	Manuele sondage bij twijfel	0.5	2	3	3
14	Verwijderen afval	Werfafval	Struikelen	6	6	1	36	Afvalcontainers met signalisatie	3	6	1	18
15	Verwijderen afval	Werfafval	Geen beheer afval	6	6	1	36	Verzamelen bouw materiaal en dagelijkse opkuis	3	6	1	18
16	Werken met werftoestellen	Draaiende delen werftoestellen	Aanraking draaiende delen	6	6	7	252	Noodstopinrichting Veiligheidsafscherming	0.5	6	7	21
17	Werken met werftoestellen	Wegvliegende deeltjes bewerkt stuk	Oogkwetsuren	6	6	7	252	Veiligheidsbril	0.5	6	7	21
18	Werken met werftoestellen	Werftoestellen	Gehoorschade	10	6	7	420	Gehoorscherming	0.5	6	7	21



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
19	Opwaaien kwartsstof	Kwartsstof	Gezondheidsklachten door inademen kwartsstof	6	6	7	252	Vernevelen	0.5	6	7	21
20	Werken met gevaarlijke producten	Gevaarlijke producten	Accidenteel contact	3	3	3	27	Beschikbaarheid MSDS en VIK Gevaarsetikettering Kennis noodprocedures Spill-kit Stockage op lekbakken	0.5	3	3	4.5
21	Fysieke arbeid	Bouwmateriaal	Fysieke overbelasting	10	6	7	420	Aangepaste hef- en hijs hulpmiddelen Toepassing richtlijnen manueel hanteren van lasten Werktafel	0.5	6	7	21
22	Overdracht veiligheidsrichtlijnen	Onthaal	Geen overdracht geldende veiligheidsrichtlijnen	6	3	3	54	Uithangen werfeigen instructies: werfmelding, noodprocedures route naar ziekenhuis, brandblusser, EHBO, verzamelplaats, rookplaats Werfsignalisatie 'verplicht aanmelden'	0.5	3	3	4.5
23	Dragen werkkledij en pbm's	Werkkledij en PBM's	Ongevallen door niet dragen werkkledij en PBM's	3	6	3	54	Risicogebonden PBM's Werfsignalisatie: Veiligheidshelm, veiligheidsschoenen S3, fluokledij (hesje of vest)	1	6	3	18

ALHEEMBOUW



Milieubeheersing			
Documentcode	RA23/000011	Workflowstatus	Finaal
Versiedatum	09/02/2023	Risicoanalyseformulenaam	Kinney
Bedrijfstaak	Milieubeheersing	Entiteit	
Werkpost		Bedrijfsvestiging	
Functie		Bedrijfsafdeling	
Welzijnsdomein		Project	
Beheerders	DECEUNINCK Miguel		
Omschrijving			

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Afbraakwerken	Stof	Stofontwikkeling naar omwonenden	10	2	1	20	Afdekzeilen containers voor puin Besproeiing / Verneveling Werfomheining met stofwanden	3	2	1	6
2	Afbraakwerken	Asbest	Gezondheidsklachten door inademen van asbestvezels	6	2	15	180	Asbestinventaris opvragen Asbestverwijdering door erkende onderaannemer	0.5	2	15	15
2	Afbraakwerken	Afvoerprocedure	Breekpuin ondeskundig afvoeren	3	2	7	42	Breekpuin afvoeren volgens Tracimat systeem Traceerbaarheidsprocedure	0.5	2	1	1
2	Grondverzet	Grond	Vervuilde grond naar een andere kavel brengen	3	2	7	42	Traceerbaarheidsprocedure Werken via bemonstering, classificatie en de grondbank	0.5	2	1	1
2	Bronbemaling	Water	Bodemschade door ondeskundige bronbemaling	6	2	1	12	Sondering, risicobepaling, vergunningsaanvraag via digitale omgevingsloket	1	2	1	2
2	Boringen paalfunderingen / Inslaan damplaten	Trillingen	Schade aan omliggende gebouwen door trillingen	3	2	1	6	Afspraken tijdstip werken Gerichte maatregelen zoals beschoeiing Voorafgaandelijk onderzoek	1	2	1	2
2	Boringen paalfunderingen / Inslaan damplaten	Lawaai	Lawaaioverlast naar omwonenden	10	2	1	20	Afspraken met omwonenden Respecteren plaatselijke beginuren	1	2	1	2



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Werfinrichting	Afvalwater	Willekeurige lozing afvalwater	3	2	1	6	Aansluiten op riolering Opvangciterne onder toiletcontainer Tijdelijke septische put	1	2	1	2
9	Werfinrichting	Gevaarlijke producten	Lekkages brandstofstofvoorziening en andere gevaarlijke vloeibare producten	3	6	1	18	Dubbelwandige opslagtank brandstoffen Opvangbakken voor de stockage van vloeibare recipiënten Pictogrammen herkennen gevaren Spill-kit Trechter voor overgieten brandstof	1	6	1	6
10	Werfinrichting	Brandstofgassen	Rookgassen naar omwonenden	3	6	1	18	Aangepaste locatie Alternatieve stroomvoorziening	1	6	1	6
11	Verwijderen afval	Werfafval	Milieubezoedeling	6	6	1	36	Afhaalbewijs bij afvalophaling Bouwafval meenemen naar koer voor gerichte verwijdering Gerichte afvalcontainers voor de aanwezige afvalstromen Kipbakken voor verzameling afval en intern werftransport Mortelkuipen onmiddellijk reinigen - beton of mortelresten niet laten uitdrogen in kuip Signalisatie afvalcontainers Tijdige organisatie afvalophaling	1	6	1	6
12	Verwijderen afval	Werfafval	Afwezigheid gerichte afvalcontainer	6	2	1	12	Toolbox bouwafval	0.5	2	1	1
13	Intern verkeer en aangedreven arbeidsmiddelen	Verkeer	Lawaaioverlast naar omwonenden	6	6	1	36	Afspraken met omwonenden Respecteren plaatselijke beginuren	0.5	6	1	3
14	Intern verkeer en aangedreven arbeidsmiddelen	Brandstofgassen	Rookgassen naar omwonenden	3	1	1	3	Bij stationeren of parkeren motor stilleggen	1	1	1	1



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
15	Intern verkeer en aangedreven arbeidsmiddelen	Kwartsstof	Rookgassen naar omwonenden	6	2	1	12	Arbeidsmiddelen met watertoevoer en stofafzuiging Besproeiing / Verneveling Verharding doorgangen Werfomheining met stofwanden	1	2	1	2
16	Werken met gassen	Gassen	Explosie gasflessen	1	1	15	15	Beschermkop cilinder Periodiek onderhoud Plaatsing weg van warmtebron Signalisatie type gasflessen Vastmaken gasflessen ter voorkoming van omvallen (stockagerek of duwwagen)	0.5	1	15	7.5
17	Werken met open vlam	Brand	Rookgassen naar omwonenden	3	3	15	135	Gerichte blusmiddelen Veiligheidsafstanden bij werken met open vlam Vuurdeken of beschermwand Vuurvergunning	0.5	3	15	22.5
18	Werken in de nabijheid van wateropslag of waterloop	Waterloop	Overstroming omgeving	3	3	1	9	Dijken of damwanden	1	3	1	3
19	Werken in de nabijheid van wateropslag of waterloop	Waterloop	Bezoedeling van de wateropslag of waterloop	3	3	1	9	Voorzorgen nemen i.v.m. opslag en gebruik producten	1	3	1	3

ALHEEMBOUW



Laden en lossen			
Documentcode	RA23/000002	Workflowstatus	Finaal
Versiedatum	06/02/2023	Risicoanalyseformulenaam	Kinney
Bedrijfstaak	Laden en lossen	Entiteit	
Werkpost		Bedrijfsvestiging	
Functie		Bedrijfsafdeling	
Welzijnsdomein		Project	
Beheerders	DECEUNINCK Miguel		
Omschrijving			

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Aankomst op de bouwwerf	Werfafspraken	Ontbrekende veiligheidscommunicatie	6	2	3	36	Aanmeldingsprocedure Levering tijdens werkuren ploegen Voorafgaandelijke afspraken met contactpersoon	1	2	3	6
2	Rijden op de bouwwerf	Doorgangen	Contact met obstakels en aanrijdingen	6	6	3	108	Begeleiding werftransport Check hoogte doorgangen (leidingen, bruggen, steigerbouw) Gerichte verlichting Respecteren interne verkeersregels Signalisatie rijroute	1	6	3	18
2	Rijden op de bouwwerf	Doorgangen	Slipgevaar of kantelen vrachtwagen	6	6	3	108	Conforme ladingzekering Rijplaten Signalisatie obstakels en niveauverschillen Stabiele ondergrond van de rijwegen Veilige afstand tot bouwput	1	6	3	18
2	Verlaten bestuurscabine	Vrachtwagen	Verzwikking	6	6	3	108	Hoge veiligheidsschoenen Niet springen uit vrachtwagen: gebruik maken van toegangstreden en leuning op vrachtwagen Veters goed gebonden	1	6	3	18



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Verlaten bestuurscabine	Verkeer	Aanrijding	6	2	15	180	Fluokledij Signalisatie loszone Vergunning ingebruikname openbare weg indien van toepassing	0.5	6	15	45
2	Stationeren vrachtwagen	Ondergrond	Slipgevaar of kantelen vrachtwagen	6	6	3	108	Gebruik stempelplaten Stabiele ondergrond Stempels	1	6	3	18
2	Toegang tot oplegger voor aanslaan van lasten	Ladder	Val van personen	6	6	3	108	Intacte ladder Ladder 1m boven uitstapplaats Stabiele plaatsing	0.5	6	3	9
2	Toegang tot oplegger voor aanslaan van lasten	Oplegger	Val van personen	6	6	3	108	Oplegger naast oplegger Steigerbouw naast oplegger	0.5	6	3	9
9	Verplaatsen bouw materiaal	Fysieke belasting	Overbelasting gewrichten en spieren	6	6	7	252	Gebruik gerichte transportrekken Toepassing richtlijnen manueel hanteren van lasten Werken met aangepaste hefwerktuigen i.f.v. last en ondergrond	1	6	7	42
10	Verplaatsen bouw materiaal	Aanslagmateriaal	Materiaalbreuk	6	6	7	252	Gekeurd hijswerktuig en aanslagmateriaal Respecteren maximale belasting	1	6	7	42
11	Verplaatsen bouw materiaal	Bouw materiaal	Kwetsuren handen tijdens aanslaan	6	6	3	108	Gebruik pens of koevoet voor manipulatie tussen/onder bouwmaterialen Nooit handen tussen bouwmaterialen Veiligheidshandschoenen	1	6	3	18
12	Verplaatsen bouw materiaal	Lawaai	Gehoorschade	10	3	3	90	Afstand tot motor hefwerktuig Gehoorbescherming Sluiten van deuren en ramen van hefwerktuigen	0.5	3	3	4.5
13	Gebruik mobiele hefwerktuigen (heftruck, verreiker)	Mobiele hefwerktuigen	Verlies controle mobiele hefwerktuigen	6	3	15	270	Afspraken locatie en overhandiging contactsleutel Contactsleutel bij onbemande hefwerktuigen verwijderen Opleidingsattest	1	3	15	45
14	Gebruik mobiele hefwerktuigen (heftruck, verreiker)	Mobiele hefwerktuigen	Knelling	6	3	15	270	ROPS en FOPS	1	3	15	45



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
15	Stockage bouwmaterialen	Bouwmateriaal	Kantelen	6	2	7	84	Gestockeerder bouwmaterialen borgen tegen mogelijks kantelen Hoogte stockage i.f.v. hellingsgraad ondergrond Stockage op stabiele ondergrond	0.5	2	7	7
16	Stockage bouwmaterialen	Bouwmateriaal	Stoten waardoor kwesturen	6	2	3	36	Afscherming scherpe bouwonderdelen Afspraken m.b.t. efficiënte plaatsing en bereikbaarheid Bij beperkte ruimte meerdere kleinere leveringen	0.5	2	3	3
17	Stockage bouwmaterialen	Bouwmateriaal	Roestvlekken op beton (kwaliteit)	6	2	1	12	Wapening niet rechtstreeks stockeren: plaatsen op beton: gebruik houten dragers	0.5	2	1	1

ALHEEMBOUW



Plaatsen verloren bekisting			
Documentcode	RA23/000005	Workflowstatus	Finaal
Versiedatum	09/02/2023	Risicoanalyseformulenaam	Kinney
Bedrijfstaak	Plaatsen verloren bekisting	Entiteit	
Werkpost		Bedrijfsvestiging	
Functie		Bedrijfsafdeling	
Welzijnsdomein		Project	
Beheerders	DECEUNINCK Miguel		
Omschrijving			

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Op maat zagen verloren bekisting	Handzaagmachine	Inzaagverwondingen	6	6	3	108	Afschermkap Bij voorkeur bekistingsplaten op maat afroepen Dodemansknop Handzaagmachine met geleiders Intact zaagblad Stabiele werktafel of schragen	1	3	3	9
2	Op maat zagen verloren bekisting	Decoupeerzaag	Inzaagverwondingen	6	6	3	108	Bij voorkeur bekistingsplaten op maat afroepen Dodemansknop Stabiele werktafel of schragen	1	3	3	9
2	Op maat zagen verloren bekisting	Hout	Houtsplinters in handen	6	3	3	54	Veiligheidshandschoenen	1	3	3	9
2	Op maat zagen verloren bekisting	Hout	Oogkwetsuren	6	3	7	126	Veiligheidsbril	1	3	7	21
2	Op maat zagen verloren bekisting	Houtafval	Struikelen	6	6	3	108	Plaats kippak voor houtafval	1	6	3	18
2	Op maat zagen verloren bekisting	Houtstof	Gezondheidsklachten door inademen houtstof	6	3	7	126	Afzuiginrichting binnenwerk	1	3	7	21
2	Toegang tot put / sleuf	Bouwputrand	Inzakken putrand	6	6	3	108	Geen stockage op putrand Graafwerk in veilige talud in functie van type grond	1	6	3	18
2	Toegang tot put / sleuf	Bouwputrand	Val van personen	6	6	3	108	Randbeveiliging	1	6	3	18



ALHEEMBOUW

Risicoanalyse

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
9	Toegang tot put / sleuf	Bouwputrand	Val van personen	6	6	3	108	Signalisatie van hoogteverschillen op 1,5m van de rand	1	6	3	18
10	Toegang tot put / sleuf	Sleuven	Val van personen	6	6	3	108	Gebruik loopbruggen met leuning	1	6	3	18
11	Toegang tot put / sleuf	Ladder	Val van personen	6	6	3	108	Ladder 1m boven putrand Stabiele plaatsing	1	6	3	18
12	Plaatsen verloren bekisting in funderingsput	Fysieke belasting	Overbelasting gewrichten en spieren	6	6	3	108	Hulp van collega Platen aanvoeren met hef- op hefwerktuigen	1	6	3	18
13	Plaatsen verloren bekisting in funderingsput	Wapening	Knelling	6	6	3	108	Geen handen plaatsen tussen wapening en bekistingsplaat Nooit handen tussen wapening: gebruik koevoet	1	6	3	18
14	Wegsnijden overtollige plastic	Breekmes	Snijwonden	6	3	3	54	Gebruik veiligheidsmes Snijden weg van lichaam Veiligheidshandschoenen	1	3	3	9
15	Stappen over wapeningskorven	Doorgangen	Verzwikking	6	3	3	54	Plaatsen loopbruggen met leuning	1	3	3	9

ALHEEMBOUW



Plaatsen plintbekisting			
Documentcode	RA23/000016	Workflowstatus	Finaal
Versiedatum	09/02/2023	Risicoanalyseformulenaam	Kinney
Bedrijfstaak	Plaatsen plintbekisting	Entiteit	
Werkpost		Bedrijfsvestiging	
Functie		Bedrijfsafdeling	
Welzijnsdomein		Project	
Beheerders	DECEUNINCK Miguel		
Omschrijving			

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Aanvoer bekistingspanelen	Bekistingspanelen	Val van bouw materiaal	3	3	15	135	Gebruik voorziene transportrekken en aanslagmateriaal	1	3	15	45
2	Tussenstockage bekistingspanelen	Bekistingspanelen	Kantelen	6	3	15	270	Baddens onder panelen Horizontaal stockage op stabiele ondergrond	0.5	3	15	22.5
2	Vorbereiding bekistingspanelen	Bekistingsolie	Irritatie door ademhaling	3	2	3	18	Buitengebruik Niet werken tegen de wind Ventilatie	0.5	2	3	3
2	Vorbereiding bekistingspanelen	Bekistingsolie	Oogirritatie	3	2	3	18	Veiligheidsbril	0.5	2	3	3
2	Vorbereiding bekistingspanelen	Bekistingsolie	Huidirritatie	3	2	3	18	Veiligheidshandschoenen	0.5	2	3	3
2	Vorbereiding bekistingspanelen	Bekistingsolie	Gezondheidsrisico's	3	2	3	18	Beschikbaarheid MSDS en VIK	0.5	2	3	3
2	Uitzetten bekistingspanelen	Lawaai	Gehoorschade	6	3	3	54	Gehoorbescherming	1	3	3	9
2	Uitzetten bekistingspanelen	Boormachine	Kwetsuren door griperen	3	2	3	18	Inboren met 2 handen	1	2	3	6
9	Plaatsen bekistingspanelen	Wind	Stoten waardoor kwetturen	6	3	7	126	Begeleiding paneel De toegelaten werking met wind respecteren	1	3	7	21



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
10	Plaatsen bekistingspanelen	Bouwmateriaal	Struikelen	3	6	7	126	Gebruik montagebakken Niets laten slingeren	1	6	7	42
11	Plaatsen bekistingspanelen	Lawaai	Gehoorschade	6	3	7	126	Gehoorbescherming	1	3	7	21
12	Plaatsen bekistingspanelen	Boormachine	Kwetsuren door griperen	3	2	3	18	Inboren met 2 handen	1	2	3	6
13	Plaatsen bekistingspanelen	Bekistingspanelen	Knelling	6	3	3	54	Gebruik intact handgereedschap Nooit vingers onder paneel plaatsen Panelen aan de binnenkant of achterrug manipuleren Veiligheidshandschoenen Werk met gerichte hijsankers Werk met hulpmiddelen / pens om paneel te positioneren	1	3	3	9
14	Plaatsen bekistingspanelen	Fysieke belasting	Overbelasting gewrichten en spieren	3	6	3	54	Aangepaste montagemiddelen Correcte werkhouding Hulp van collega	1	6	3	18
15	Plaatsen bekistingspanelen	Bekistingspanelen	Omvalen	6	3	15	270	Gebruik de correcte betonschroeven i.f.v. het type schoren Gebruik originele borgpennen Gebruik voorziene spieën Onmiddellijk schoren Zolang geen schoring bekistingspaneel met hijsketting op spanning houden Schoorvoeten volledig laten steunen Stabiele, effen ondergrond Werken volgens montageplan	1	3	15	45
16	Demontage wandbekisting	Hoogte	Val van personen	6	3	15	270	Demontage vanop de begane grond	1	3	15	45
17	Reinigen	Hogedrukreiniger	Oogkwetsuren	6	3	7	126	Veiligheidsbril	1	3	7	21
18	Reinigen	Hogedrukreiniger	Gehoorschade	6	3	7	126	Gehoorbescherming	1	3	7	21



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
19	Reinigen	Paneelreiniger	Inademen gevaarlijke dampen	3	2	7	42	Buitengebruik Gebruik FFP3 bij binnenwerk Niet werken tegen de wind Ventilatie	0.5	2	3	3
20	Reinigen	Paneelreiniger	Oogirritatie	3	2	3	18	Veiligheidsbril	0.5	2	3	3
21	Reinigen	Paneelreiniger	Huidirritatie	3	2	3	18	Veiligheidshandschoenen	0.5	2	3	3
22	Reinigen	Paneelreiniger	Gezondheidsrisico's	3	2	7	42	Beschikbaarheid MSDS en VIK	0.5	2	7	7

ALHEEMBOUW



Plaatsen predallen			
Documentcode	RA23/000024	Workflowstatus	Concept
Versiedatum	09/02/2023	Risicoanalyseformulenaam	Kinney
Bedrijfstaak	Plaatsen predallen	Entiteit	
Werkpost		Bedrijfsvestiging	
Functie		Bedrijfsafdeling	
Welzijnsdomein		Project	
Beheerders	DECEUNINCK Miguel		
Omschrijving			

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Leveren predallen	Lading	Wegschuiven predallen	3	6	15	270	Conforme ladingzekering	0.2	6	15	18
2	Leveren predallen	Terrein	Wegschuiven predallen	3	6	15	270	Effen terrein Stabiele ondergrond	0.2	6	15	18
2	Leveren predallen	Obstakels	Aanrijding	3	6	15	270	Begeleiding werftransport Signalisatie obstakels en niveauverschillen	0.2	6	15	18
2	Tussenstockage predallen	Predallen	Kantelen	6	6	15	540	Stabiele ondergrond Stapelen van grote platen onderaan	1	6	15	90
2	Aanslaan predallen vanop oplegger	Ladder	Val van personen	3	6	15	270	Toegangsladder 1m boven element	1	6	15	90
2	Aanslaan predallen vanop oplegger	Oplegger	Val van personen	3	6	15	270	Gebruik steigerbouw Persoonlijke valbeveiliging	1	6	15	90
2	Hijswerk predallen	Hijswerk	Stoten	3	6	15	270	Chauffeur uit de cabine Impactveilige cabine-oplegger	0.5	6	15	45
2	Aanslaan predallen vanop oplegger	Kettingen	Knelling	3	6	7	126	Aanslaan aan knooppunt wapening Aanslaan met overkragingsafstand van ongeveer 1/5de van de lengte van de predal Gebruik viersprongketting tot plaatlengte van 4,5m; een zessprongketting tot 6,5m en evenaar indien groter dan 6,5m Geen vingers tussen ketting na hijssein	0.5	6	7	21



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
9	Hijswerk predallen	Predallen	Val van prefab	3	6	15	270	Gekeurd hijswerktuig en aanslagmateriaal Hijshoek kleiner dan 90° - idealiter 60° Hijspan Hijswerktuigen en aanslagmateriaal in functie te verplaatsen predallen Hijzone signaleren Niet hijsen boven personen Niet onder lasten lopen Veiligheidsbeugel kettingshaak naar buiten	0.5	6	15	45
10	Toegang tot predallen	Hoogte	Val van personen	6	6	15	540	Planning prefabtrap Telescopische ladder met toegangsbordes Trappentoren	0.5	6	15	45
11	Begeleiden en positioneren predallen	Wind	Uitwijken last	6	6	3	108	Begeleiden last met touw Goede communicatie-afspraken met kraanman en rigger Werk staken vanaf windkracht 6	0.5	6	3	9
12	Begeleiden en positioneren predallen	Predallen	Val van personen	6	6	15	540	1ste plaatsen vanuit schaarlift	0.5	6	15	45
13	Begeleiden en positioneren predallen	Schaarlift	Val van personen	3	6	15	270	Antivalharnas met korte veiligheidslijn Niet onder lasten lopen Schaarlift aangepast aan terrein Laten positioneren, dan benaderen met schaarlift	0.5	6	15	45
14	Begeleiden en positioneren predallen	Hoogte	Val van personen	6	6	15	540	Persoonlijke beveiligen verankeringaan knooppunt wapening Systematisch plaatsen van randbeveiliging Valstopapparaat bij werkhoogte boven 4m Werkbegrenzing bij werkhoogte onder 4m	0.5	6	15	45
15	Begeleiden en positioneren predallen	Ondersteunende steigers	Val van personen	3	6	15	270	Dubbele vanglijn Plaatsen met schaarlift Plaatsen werkplatform met randbeveiliging	0.5	6	15	45



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
16	Begeleiden en positioneren predallen	Predallen	Breken van prefab bij positioneren	3	6	15	270	De tussenafstand van de schoren en draagbalen volgens legplan; alle 80-100 cm en zijkanten Minimum 5 cm ondersteuning van de randen Plaatsten volgens legplan en instructies leverancier Predallen aannemen op 1,20 m boven ander gewelf	0.5	6	15	45
17	Begeleiden en positioneren predallen	Predallen	Knelling	6	6	3	108	Nooit vingers tussen/onder predallen plaatsen	0.5	6	3	9
18	Begeleiden en positioneren predallen	Fysieke belasting	Fysieke overbelasting	6	6	3	108	Gebruik pens of koevoet voor manipulatie tussen/onder bouwmaterialen Stabiele werkhouding Werken met 'rechte' rug	0.5	6	3	9
19	Begeleiden en positioneren predallen	Schoren	Te vlug verwijderen schoren waardoor onstabiel gevelement	6	3	15	270	Respecteren droogtijd van gegoten druklaag	0.5	3	15	22.5
20	Begeleiden en positioneren predallen	Opening	Val van personen	6	6	15	540	Duurzame afscherming openingen	0.5	6	15	45

ALHEEMBOUW



Plaatsen prefab balken

Documentcode	RA23/000020	Workflowstatus	Finaal
Versiedatum	09/02/2023	Risicoanalyseformulenaam	Kinney
Bedrijfstaak	Plaatsen prefab balken	Entiteit	
Werkpost		Bedrijfsvestiging	
Functie		Bedrijfsafdeling	
Welzijnsdomein		Project	
Beheerders	DECEUNINCK Miguel		
Omschrijving			

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Leveren prefab balken	Terrein	Wegschuiven balk van oplegger	3	6	15	270	Conforme ladingzekering Effen terrein Stabiele ondergrond	0.2	6	15	18
2	Leveren prefab balken	Obstakels	Aanrijding	3	6	15	270	Begeleiding werftransport Signalisatie obstakels en niveauverschillen	0.2	6	15	18
2	Plaatsen neopreen	Hoogwerker	Val van personen	6	6	15	540	Antivalharnas met korte veiligheidslijn Hoogwerker aangepast aan terrein	1	6	15	90
2	Hijswerk balk	Balk	Stoten	3	6	15	270	Chauffeur uit de cabine Impactveilige cabine-oplegger	0.5	6	15	45
2	Hijswerk balk	Oplegger	Val van personen	3	6	15	270	Conforme toegangsladder 1m boven uitstapplaats Randbeveiliging oplegger Steigerbouw naast oplegger	1	6	15	90



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Hijswerk balk	Balk	Val van prefab	3	6	15	270	Aanslaan aan ingegoten hijsankers Aanslaan met hijsas Eerst balk positioneren dan benaderen met hoogwerker Evenwichtig aanbrengen hijsstrop met borging tegen verschuiven Gebruik evenaar i.f.v. dimensies Gekeurd hijswerktuig en aanslagmateriaal Hijshoek kleiner dan 90° - idealiter 60° Hijswerktuigen en aanslagmateriaal in functie te verplaatsen prefab Hijszone signaleren Niet hijsen boven personen Niet onder lasten lopen Veiligheidsbeugel kettingshaak naar buiten	0.5	6	15	45
2	Tussenstockage	Balk	Kantelen	6	6	15	540	Gebruik hard tussenhout Stabiele stockage Ronde kolommen beveiligen tegen rollen Stabiele ondergrond Waterpas terrein	1	6	15	90
2	Tussenstockage	Wapening	Stoten waardoor kwesturen	3	6	3	54	Afschermen van wapening	1	6	3	18
9	Begeleiden en positioneren balk boven wachtwapening	Hoogwerker	Val van personen	6	6	15	540	Antivalharnas met korte veiligheidslijn Hoogwerker aangepast aan terrein	1	6	15	90
10	Begeleiden en positioneren balk boven wachtwapening	Hoogwerker	Knelling	6	6	15	540	Antiknellingsysteem op hoogwerker	1	6	15	90
11	Begeleiden en positioneren balk boven wachtwapening	Balk	Knelling	6	6	3	108	Nooit vingers tussen kolomvoet en vloer plaatsen Plaats callageplaatjes centraal	0.5	6	3	9
12	Begeleiden en positioneren balk boven wachtwapening	Fysieke belasting	Fysieke overbelasting	6	6	3	108	Gebruik pens of koevoet voor manipulatie tussen/onder bouwmaterialen Stabiele werkhouding Werken met 'rechte' rug	0.5	6	3	9



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
13	Begeleiden en positioneren balk boven wachtwapening	Wind	Uitwijken last	6	6	3	108	Begeleiden last met touw Goede communicatie-afspraken met kraanman en rigger	0.5	6	3	9
14	Opgieten wachthulzen	Gietmortel	Huidirritatie	3	3	3	27	Veiligheidshandschoenen	0.5	3	3	4.5
15	Opgieten wachthulzen	Gietmortel	Oogkwetsuren	3	3	3	27	Veiligheidsbril	0.5	3	3	4.5
16	Opgieten wachthulzen	Gietmortel	Huidirritatie	3	3	3	27	Veiligheidshandschoenen	0.5	3	3	4.5
17	Opgieten wachthulzen	Gietmortel	Oogkwetsuren	3	3	3	27	Veiligheidsbril	0.5	3	3	4.5
18	Opgieten wachthulzen	Gietmortel	Huidirritatie	3	3	3	27	Veiligheidshandschoenen	0.5	3	3	4.5
19	Opgieten wachthulzen	Gietmortel	Oogkwetsuren	3	3	3	27	Veiligheidsbril	0.5	3	3	4.5
20	Opgieten wachthulzen	Balk	Val niet opgegoten balk	1	6	15	90	Signalisatie van zone niet opgegoten balk Type trek- en duwshoren i.f.v. balk in afwachting van opgieten	0.5	6	15	45
21	Opgieten wachthulzen	Balk	Vroegtijdige belasting balk	6	3	15	270	Respecteren droogtijd van gegoten beton	0.5	3	15	22.5
22	Begeleiden en positioneren van prefabelement	Uitstekende scherpe objecten	Kwetsuren	1	3	3	9	Gebruik veiligheidshandschoenen Visueel nazicht voor de werken te starten	0.5	3	3	4.5

ALHEEMBOUW



Plaatsen prefab kolommen			
Documentcode	RA23/000019	Workflowstatus	Concept
Versiedatum	09/02/2023	Risicoanalyseformulenaam	Kinney
Bedrijfstaak	Plaatsen prefab kolommen	Entiteit	
Werkpost		Bedrijfsvestiging	
Functie		Bedrijfsafdeling	
Welzijnsdomein		Project	
Beheerders	DECEUNINCK Miguel		
Omschrijving			

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Leveren prefab kolommen	Terrein	Wegschuiven kolommen van oplegger	3	6	15	270	Conforme ladingzekering Stabiele, effen ondergrond	0.2	6	15	18
2	Leveren prefab kolommen	Obstakels	Aanrijding	3	6	15	270	Begeleiding werftransport Signalisatie obstakels en niveauverschillen	0.2	6	15	18
2	Hijswerk kolom	Kolom	Stoten	3	6	15	270	Chauffeur uit de cabine Impactveilige cabine-oplegger Nooit rechtstreekse plaatsing vanop oplegger: tussenstockage	0.5	6	15	45
2	Hijswerk kolom	Kolom	Val van prefab	3	6	15	270	Aanslaan aan ingegoten hijsankers Borgingen tegen beweging Gebruik evenaar i.f.v. dimensies Gekeurd hijswerktuig en aanslagmateriaal Hijshoek kleiner dan 90° - idealiter 60° Hijswerktuigen en aanslagmateriaal in functie te verplaatsen prefab Hijszone signaleren Niet hijsen boven personen Niet onder lasten lopen Veiligheidsbeugel kettingshaak naar buiten	0.5	6	15	45



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Hijswerk kolom	Oplegger	Val van personen	3	6	15	270	Conforme toegangsladder 1m boven uitstapplaats Randbeveiliging oplegger Steigerbouw naast oplegger	1	6	15	90
2	Tussenstockage kolommen	Kolom	Kantelen	6	6	15	540	Gebruik hard tussenhout Ronde kolommen beveiligen tegen rollen Stabiele ondergrond Stabiele stockage in hoogte i.f.v. dimensies Waterpas terrein	1	6	15	90
2	Tussenstockage kolommen	Wapening	Stoten waardoor kwesturen	3	6	3	54	Afschermen van wapening	1	6	3	18
2	Rechten kolommen	Wachtbuizen kolom	Hinder bij rechten kolom over wapening	3	6	3	54	Controle vrije wachthulzen alvorens kolom te rechten	1	6	3	18
9	Rechten kolommen	Hijzas	Val van bouw materiaal	3	6	15	270	Gekeurde hijzas Hijzas met stevige veiligheidsborging	1	6	15	90
10	Rechten kolommen	Ondergrond	Weggliden kolomvoet	6	3	3	54	Kolomvoet laten steunen op niet gladde ondergrond tijdens rechten	0.5	3	3	4.5
11	Rechten kolommen	Wachtstaaf	Wachtstaaf niet lang genoeg	3	2	1	6	Wachtstaaf berekend i.f.v. dimensies kolom. (Lengte wachtstaaf is min. 40 x de diameter van de wachtstaaf)	0.5	2	1	1
12	Bevestigen trek- en duwchoren aan kolom	Schoren	Val van bouw materiaal	6	3	3	54	Plaatsing borging tegen het uitschuiven van de schoor tijdens plaatsing Trek- en duwchoren monteren van begane grond op horizontale kolom in voorziene schroefhulzen/ankerplaatjes	0.5	3	3	4.5
13	Bevestigen trek- en duwchoren aan kolom	Lawaai	Gehoorschade	3	3	7	63	Gehoorsbescherming	0.2	3	7	4.2
14	Begeleiden en positioneren kolom boven wachtwapening	Kolom	Knelling	6	6	3	108	Nooit vingers tussen kolomvoet en vloer plaatsen Plaats callageplaatjes centraal	0.5	6	3	9
15	Begeleiden en positioneren kolom boven wachtwapening	Fysieke belasting	Fysieke overbelasting	6	6	3	108	Gebruik pens of koevoet voor manipulatie tussen/onder bouwmaterialen Stabiele werkhouding Werken met 'rechte' rug	0.5	6	3	9




#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
16	Begeleiden en positioneren kolom boven wachtwapening	Wind	Uitwijken last	6	6	3	108	Begeleiden last met touw Goede communicatie-afspraken met kraanman en rigger Werk staken vanaf windkracht 6	0.5	6	3	9
17	Inboren in beton	Schoren	Val van prefab	3	6	15	270	Aangrijppunt op 2/3 hoogte van kolom Boor de schoren in voldoende dikke beton van min 12 cm (betonvloer of stabiele betonblok) De schoor niet maximaal uitdraaien zodat bijregelen mogelijk is Gebruik de correcte betonschroeven i.f.v. het type schoren Nooit borgpen uit schoor onder spanning verwijderen Zolang geen schoring bekistingspaneel met hijsketting op spanning houden Originele borgpen gebruiken Plaatsing in correcte hoek > 30° Schoorvoeten volledig laten steunen Standaard 4 schoren, tenzij je perfect weet vanwaar de wind komt : steeds 2 trek- en duwschoren tegen de wind in Type trek- en duwschoren i.f.v. kolom	0.5	6	15	45
18	Verwijderen hijsas	Hoogwerker	Val van personen	3	6	15	270	Antivalharnas met korte veiligheidslijn Hoogwerker aangepast aan terrein	0.5	6	15	45
19	Opgieten wachthulzen	Gietmortel	Huidirritatie	3	3	3	27	Veiligheidshandschoenen	0.5	3	3	4.5
20	Opgieten wachthulzen	Gietmortel	Oogkwetsuren	3	3	3	27	Veiligheidsbril	0.5	3	3	4.5
21	Verwijderen trek- en duwschoren	Schoren	Te vlug verwijderen schoren waardoor onstabiele prefab	6	3	15	270	Respecteren droogtijd	0.5	3	15	22.5
22	Verwijderen trek- en duwschoren	Hoogwerker	Val van personen	3	6	15	270	Antivalharnas met korte veiligheidslijn	0.5	6	15	45
23	Verwijderen trek- en duwschoren	Schoren	Knelling	6	3	3	54	De borgpen na demontage uit schoor verwijderen op de begane grond	0.5	3	3	4.5



ALHEEMBOUW

Risicoanalyse

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
24	Begeleiden en positioneren van prefabelement	Uitstekende scherpe objecten	Kwetsuren	1	3	3	9	Gebruik veiligheidshandschoenen Visueel nazicht voor de werken te starten	0.5	3	3	4.5

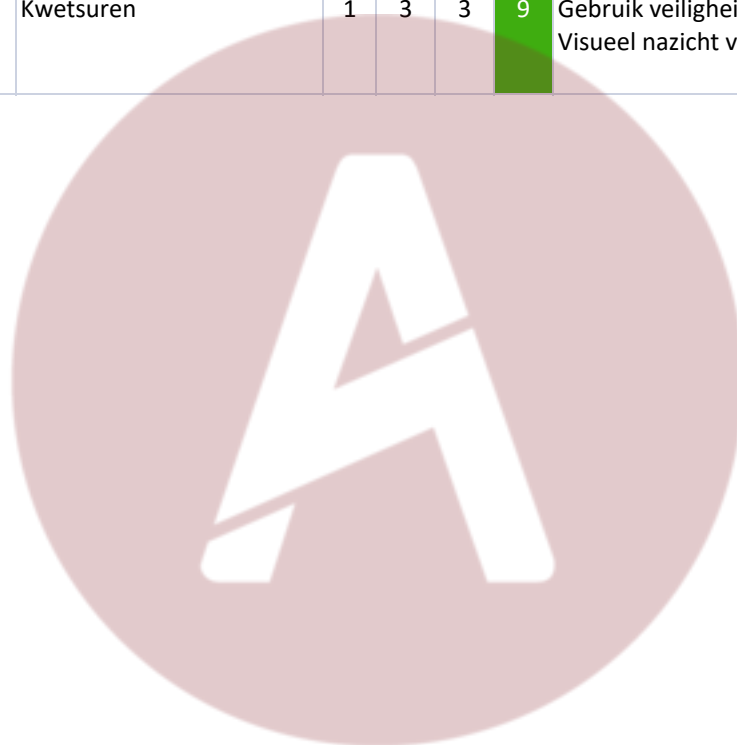

ALHEEMBOUW



Plaatsen gewelven			
Documentcode	RA23/000023	Workflowstatus	Concept
Versiedatum	09/02/2023	Risicoanalyseformulenaam	Kinney
Bedrijfstaak	Plaatsen gewelven	Entiteit	
Werkpost		Bedrijfsvestiging	
Functie		Bedrijfsafdeling	
Welzijnsdomein		Project	
Beheerders	DECEUNINCK Miguel		
Omschrijving			

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Leveren gewelven	Lading	Wegschuiven gewelven	3	6	15	270	Conforme ladingzekering	0.2	6	15	18
2	Leveren gewelven	Terrein	Wegschuiven gewelven	3	6	15	270	Effen terrein Stabiele ondergrond	0.2	6	15	18
2	Leveren gewelven	Obstakels	Aanrijding	3	6	15	270	Begeleiding werftransport Signalisatie obstakels en niveauverschillen	0.2	6	15	18
2	Tussenstockage gewelven	Gewelven	Kantelen	6	6	15	540	Intacte tussenblokken; doorstempelen Stabiele ondergrond	1	6	15	90
2	Aanslaan gewelven vanop oplegger	Ladder	Val van personen	3	6	15	270	Toegangsladder 1m boven element	1	6	15	90
2	Aanslaan gewelven vanop oplegger	Oplegger	Val van personen	3	6	15	270	Gebruik steigerbouw Persoonlijke valbeveiliging	1	6	15	90
2	Aanslaan gewelven vanop oplegger	Welfselklem	Knelling	3	6	7	126	Geen vingers tussen klem en gewelf	0.5	6	7	21
2	Aanslaan gewelven vanop oplegger	Kettingen	Knelling	3	6	7	126	Geen vingers tussen ketting na hijssein	0.5	6	7	21
9	Hijswerk gewelven	Gewelven	Stoten	3	6	15	270	Chauffeur uit de cabine Impactveilige cabine-oplegger	0.5	6	15	45



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
10	Hijswerk gewelven	Gewelven	Val van prefab	3	6	15	270	Aanslaan aan ingegoten hijsankers Gebruik veiligheidsketting van de welfselklem Gekeurd hijswerktuig en aanslagmateriaal Hijshoek kleiner dan 90° - idealiter 60° Hijspan Hijswerktuigen en aanslagmateriaal in functie te verplaatsen gewelven Hijzone signaleren Niet hijsen boven personen Niet onder lasten lopen Veiligheidsbeugel kettingshaak naar buiten	0.5	6	15	45
11	Toegang tot gewelven	Hoogte	Val van personen	6	6	15	540	Planning prefabtrap Telescopische ladder met toegangsbordes Trappentoren	0.5	6	15	45
12	Begeleiden en positioneren gewelven	Wind	Uitwijken last	6	6	3	108	Begeleiden last met touw Goede communicatie-afspraken met kraanman en rigger Werk staken vanaf windkracht 6	0.5	6	3	9
13	Begeleiden en positioneren gewelven	Hoogte	Val van personen	6	6	15	540	1ste gewelf plaatsen vanuit hoogwerker	0.5	6	15	45
14	Begeleiden en positioneren gewelven	Hoogwerker	Val van personen	3	6	15	270	Antivalharnas met korte veiligheidslijn Niet onder lasten lopen Hoogwerker aangepast aan terrein Laten positioneren, dan benaderen met hoogwerker	0.5	6	15	45
15	Begeleiden en positioneren gewelven	Gewelven	Val van personen	6	6	15	540	Gekeurde valbeveiliging Persoonlijke beveiligen verankering aan welfselklem Systematisch plaatsen van randbeveiliging Valstopapparaat bij werkhooft boven 4m Werkbegrenzing bij werkhooft onder 4m	0.5	6	15	45



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
16	Begeleiden en positioneren gewelven	Gewelven	Breken van prefab bij positioneren	3	6	15	270	Gewelven aannemen op 1,20m boven ander gewelf Gewelven opgieten Minimum 11 cm ondersteuning van de randen Plaatsten volgens legplan en instructies leverancier Schoren volgens instructies Voorgespannen gewelven niet schoren	0.5	6	15	45
17	Begeleiden en positioneren gewelven	Gewelven	Knelling	6	6	3	108	Nooit vingers tussen/onder gewelven plaatsen	0.5	6	3	9
18	Begeleiden en positioneren gewelven	Fysieke belasting	Fysieke overbelasting	6	6	3	108	Gebruik pens of koevoet voor manipulatie tussen/onder bouwmaterialen Stabiele werkhouding Werken met 'rechte' rug	0.5	6	3	9
19	Begeleiden en positioneren gewelven	Schoren	Te vlug verwijderen schoren waardoor onstabiel gevelement	6	3	15	270	Respecteren droogtijd van gegoten druklaag	0.5	3	15	22.5
20	Begeleiden en positioneren gewelven	Opening	Val van personen	6	6	15	540	Conforme vangnetten Duurzame afscherming openingen	0.5	6	15	45

ALHEEMBOUW



Plaatsen prefab balkons			
Documentcode	RA23/000026	Workflowstatus	Concept
Versiedatum	09/02/2023	Risicoanalyseformulenaam	Kinney
Bedrijfstaak	Plaatsen prefab balkons	Entiteit	
Werkpost		Bedrijfsvestiging	
Functie		Bedrijfsafdeling	
Welzijnsdomein		Project	
Beheerders	DECEUNINCK Miguel		
Omschrijving			

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Leveren balkon	Lading	Wegschuiven balkon	3	6	15	270	Conforme ladingzekering	0.2	6	15	18
2	Leveren balkon	Terrein	Wegschuiven balkon	3	6	15	270	Effen terrein Stabiele ondergrond	0.2	6	15	18
2	Leveren balkon	Obstakels	Aanrijding	3	6	15	270	Begeleiding werftransport Signalisatie obstakels en niveauverschillen	0.2	6	15	18
2	Tussenstockage balkon	Balkons	Kantelen	6	6	15	540	Stabiel plaatsen met steunblokken Stabiele ondergrond	1	6	15	90
2	Aanslaan balkon vanop oplegger	Ladder	Val van personen	3	6	15	270	Toegangsladder 1m boven element	1	6	15	90
2	Aanslaan balkon vanop oplegger	Oplegger	Val van personen	3	6	15	270	Gebruik steigerbouw Persoonlijke valbeveiliging	1	6	15	90
2	Hijswerk balkon	Hijswerk	Stoten	3	6	15	270	Chauffeur uit de cabine Impactveilige cabine-oplegger	0.5	6	15	45
2	Aanslaan balkon vanop oplegger	Kettingen	Knelling	3	6	7	126	Aanslaan aan ingegoten hijsankers Geen vingers tussen ketting na hijssein	0.5	6	7	21



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
9	Hijswerk balkon	Balkons	Val van prefab	3	6	15	270	Gekeurd hijswerktuig en aanslagmateriaal Hijshoek kleiner dan 90° - idealiter 60° Hijspan Hijswerktuigen en aanslagmateriaal in functie te verplaatsen prefab Hijzone signaleren Niet hijsen boven personen Niet onder lasten lopen Veiligheidsbeugel kettingshaak naar buiten	0.5	6	15	45
10	Plaatsen ondersteunende steigers van balkon	Ondersteunende steigers	Kantelen	3	6	15	270	Dubbele vanglijn Type steiger i.f.v. draaglast	0.5	6	15	45
11	Begeleiden en positioneren balkon	Wind	Uitwijken last	6	6	3	108	Begeleiden last met touw Goede communicatie-afspraken met kraanman en rigger Werk staken vanaf windkracht 6	0.5	6	3	9
12	Begeleiden en positioneren balkon	Balkons	Val van personen	6	6	15	540	Persoonlijke beveiligen met verankering Randbeveiliging voorzien vanop de begane grond Systematisch plaatsen van randbeveiliging Vallijn met demper - lengte vallijn i.f.v. werkhoogte Werken vanop werkplatform	0.5	6	15	45
13	Begeleiden en positioneren balkon	Balkons	Val van prefab	3	6	15	270	Plaatsten volgens legplan en instructies leverancier Prefab aannemen op 1,20 m	0.5	6	15	45
14	Begeleiden en positioneren balkon	Balkons	Knelling	6	6	3	108	Nooit vingers tussen/onder prefab plaatsen	0.5	6	3	9
15	Begeleiden en positioneren balkon	Hoogwerker	Val van personen	3	6	15	270	Antivalharnas met korte veiligheidslijn Niet hijsen boven personen Niet onder lasten lopen Hoogwerker aangepast aan terrein	0.5	6	15	45
16	Begeleiden en positioneren balkon	Fysieke belasting	Fysieke overbelasting	6	6	3	108	Gebruik pens of koevoet voor manipulatie tussen/onder bouwmaterialen Stabiele werkhouding Werken met 'rechte' rug	0.5	6	3	9



ALHEEMBOUW

Risicoanalyse

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
17	Begeleiden en positioneren balkon	Ondersteunende steigers	Te vlug verwijderen schoren waardoor onstabiele prefab	6	3	15	270	Respecteren droogtijd van gegoten beton	0.5	3	15	22.5
18	Begeleiden en positioneren van prefabelement	Uitstekende scherpe objecten	Kwetsuren	1	3	3	9	Gebruik veiligheidshandschoenen Visueel nazicht voor de werken te starten	0.5	3	3	4.5

ALHEEMBOUW



Plaatsen prefab trappen			
Documentcode	RA23/000025	Workflowstatus	Concept
Versiedatum	09/02/2023	Risicoanalyseformulenaam	Kinney
Bedrijfstaak	Plaatsen prefab trappen	Entiteit	
Werkpost		Bedrijfsvestiging	
Functie		Bedrijfsafdeling	
Welzijnsdomein		Project	
Beheerders	DECEUNINCK Miguel		
Omschrijving			

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Leveren trap	Lading	Wegschuiven trap	3	6	15	270	Conforme ladingzekering	0.2	6	15	18
2	Leveren trap	Terrein	Wegschuiven trap	3	6	15	270	Stabiele, effen ondergrond	0.2	6	15	18
2	Leveren trap	Obstakels	Aanrijding	3	6	15	270	Begeleiding werftransport Signalisatie obstakels en niveauverschillen	0.2	6	15	18
2	Tussenstockage trap	Trap	Kantelen	6	6	15	540	Stabiel plaatsen met steunblokken Stabiele ondergrond	1	6	15	90
2	Aanslaan trappen vanop oplegger	Ladder	Val van personen	3	6	15	270	Toegangsladder 1m boven element	1	6	15	90
2	Aanslaan trappen vanop oplegger	Oplegger	Val van personen	3	6	15	270	Gebruik steigerbouw	1	6	15	90
2	Hijswerk trap	Hijswerk	Stoten	3	6	15	270	Chaufeur uit de cabine Impactveilige cabine-oplegger	0.5	6	15	45
2	Aanslaan trappen vanop oplegger	Kettingen	Knelling	3	6	7	126	Aanslaan aan ingegoten hijsankers Geen vingers tussen ketting na hijssein Lengte hijsketting i.f.v. te plaatsen positie prefab trap	0.5	6	7	21



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
9	Hijswerk trap	Trap	Val van prefab	3	6	15	270	Gekeurd hijswerktuig en aanslagmateriaal Hijshoek kleiner dan 90° - idealiter 60° Hijspan Hijswerktuigen en aanslagmateriaal in functie te verplaatsen predallen Hijzone signaleren Niet hijsen boven personen Niet onder lasten lopen Veiligheidsbeugel kettingshaak naar buiten	0.5	6	15	45
10	Begeleiden en positioneren trappen	Wind	Uitwijken last	6	6	3	108	Begeleiden last met touw Goede communicatie-afspraken met kraanman en rigger Werk staken vanaf windkracht 6	0.5	6	3	9
11	Begeleiden en positioneren trappen	Trap	Val van personen	6	6	15	540	Persoonlijke beveiligen met verankering Systematisch plaatsen van randbeveiliging Vallijn met demper - lengte vallijn i.f.v. werkhoogte Werken vanop werkplatform	0.5	6	15	45
12	Begeleiden en positioneren trappen	Trap	Val van prefab	3	6	15	270	Plaatsten volgens legplan en instructies leverancier Schoren volgens instructies Trappen aannemen op 1,20 m	0.5	6	15	45
13	Begeleiden en positioneren trappen	Trap	Knelling	6	6	3	108	Nooit vingers tussen/onder prefab plaatsen	0.5	6	3	9
14	Begeleiden en positioneren trappen	Hoogwerker	Val van personen	3	6	15	270	Antivalharnas met korte veiligheidslijn Hoogwerker aangepast aan terrein Laten positioneren, dan benaderen met hoogwerker	0.5	6	15	45
15	Begeleiden en positioneren trappen	Ondersteunende steigers	Val van personen	3	6	15	270	Dubbele vanglijn Plaatsen met schaarlift Plaatsen werkplatform met randbeveiliging	0.5	6	15	45
16	Begeleiden en positioneren trappen	Fysieke belasting	Fysieke overbelasting	6	6	3	108	Gebruik pens of koevoet voor manipulatie tussen/onder bouwmaterialen Stabiele werkhouding Werken met 'rechte' rug	0.5	6	3	9



ALHEEMBOUW

Risicoanalyse

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
17	Begeleiden en positioneren trappen	Schoren	Te vlug verwijderen schoren waardoor onstabiel gevelement	6	3	15	270	Respecteren droogtijd van gegoten druklaag	0.5	3	15	22.5
18	Begeleiden en positioneren van prefabelement	Uitstekende scherpe objecten	Kwetsuren	1	3	3	9	Gebruik veiligheidshandschoenen Visueel nazicht voor de werken te starten	0.5	3	3	4.5

ALHEEMBOUW



Werken met hoogwerker - schaarlift			
Documentcode	RA23/000008	Workflowstatus	Finaal
Versiedatum	09/02/2023	Risicoanalyseformulenaam	Kinney
Bedrijfstaak	Werken met hoogwerker - schaarlift	Entiteit	
Werkpost		Bedrijfsvestiging	
Functie		Bedrijfsafdeling	
Welzijnsdomein		Project	
Beheerders	DECEUNINCK Miguel		
Omschrijving			

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Bestellen hoogwerker	Hoogwerker - Schaarlift	Toestel niet geschikt voor gebruik	3	6	15	270	Ventilatie bij binnenwerk Verbod van toestellen met fossiele brandstof in besloten ruimten	0.5	6	15	45
2	Besturen	Hoogwerker - Schaarlift	Verlies controle	3	6	15	270	Contactsleutel bij onbemande hefwerktuigen verwijderen Gekwalificeerde bediener Kennis en opvolging werkinstructies (o.a. max. belasting, ...)	0.5	6	15	45
2	Besturen	Hoogwerker - Schaarlift	Aanrijding	3	6	15	270	Aangepaste verlichting Signalisatie obstakels en niveauverschillen Signalisatie werkzone Vrijhouden rijzone	0.5	6	15	45
2	Besturen	Hoogwerker - Schaarlift	Val van personen	3	6	15	270	Aanlijnen aan voorziene ankerpunt Antivalharnas met korte veiligheidslijn Niet op leuningen staan Toegangspoort (indien aanwezig) vergrendelen Verbod werkplatform te verlaten	0.5	6	15	45



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Besturen	Hoogwerker - Schaarlift	Val van bouw materiaal	6	6	7	252	De lengte van verlengkabels i.f.v. de werkhoopte - nooit onder tractie Materiaal binnen het werkplatform houden Verbod op het transport van (grote) bouwmaterialen op de leuning van het werkplatform	0.2	6	7	8.4
2	Besturen	Hoogwerker - Schaarlift	Kantelen	3	6	15	270	Niet plaatsen op hellend vlak Respecteren snelheidsbeperkingen Rijplaten Veiligheidsafstand t.o.v. putrand Werken op geschikte ondergrond	0.5	6	15	45
2	Uitstappen hoogwerker-schaarlift	Hoogwerker - Schaarlift	Val van personen	6	6	7	252	Gebruik treden en leuning Uit het toestel stappen: niet springen	0.2	6	7	8.4
2	Werken met arbeidsmiddelen op fossiele brandstof	Brandstofgassen	Gezondheidsklachten door inademen uitlaatgassen	3	6	15	270	Ventilatie bij binnenwerk Verbod van toestellen met fossiele brandstof in besloten ruimten	0.5	6	15	45
9	Werken met arbeidsmiddelen op fossiele brandstof	Brandstofgassen	Gezondheidsklachten door inademen uitlaatgassen	3	6	15	270	Ventilatie bij binnenwerk Verbod van toestellen met fossiele brandstof in besloten ruimten	0.5	6	15	45

ALHEEMBOUW



Werken met torenkraan			
Documentcode	RA23/000009	Workflowstatus	Finaal
Versiedatum	09/02/2023	Risicoanalyseformulenaam	Kinney
Bedrijfstaak	Werken met torenkraan	Entiteit	
Werkpost		Bedrijfsvestiging	
Functie		Bedrijfsafdeling	
Welzijnsdomein		Project	
Beheerders	DECEUNINCK Miguel		
Omschrijving			

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Leveren torenkraan	Oplegger	Aanrijding	6	6	7	252	Begeleiding werftransport Gekwalificeerde leverancier Signalisatie obstakels en niveauverschillen Verharde rijroute i.f.v. last Voorafgaandelijke bepaling veilige rijroute	0.2	6	7	8.4
2	Plaatsen torenkraan	Torenkraan	Ongevallen tijdens plaatsing	3	6	15	270	Plaatsen van kraan volgens de veiligheidsrichtlijnen beschreven in de ontvangen risicoanalyse Werken met gekwalificeerde plaatsingsfirma	0.5	6	15	45
2	Plaatsen torenkraan	Torenkraan	Omvallen	3	6	15	270	Countergewicht i.f.v. draagvermogen Funderingsvoeten- en plaat i.f.v. kraantype	0.5	6	15	45
2	Plaatsen torenkraan	Torenkraan	Elektrisering tot elektrocutie	3	6	15	270	Aardingspen aanbrengen en uitmeten	0.5	6	15	45
2	Plaatsen torenkraan	Torenkraan	Uitvallen stroomtoevoer	3	6	15	270	Elektriciteitstoevoer i.f.v. type kraan Kennis bediening nooddaling hijsrem	0.5	6	15	45
2	Ingebruikname	Torenkraan	Werken met onveilige torenkraan	3	6	15	270	Keuringsverslag van indienststelling en 3-maandelijkse keuring door EDTC	0.5	6	15	45
2	Toegang tot torenkraan	Toegangsweg	Val van personen	3	6	15	270	Toegangstrap met leuning	0.5	6	15	45



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Beklimmen van torenkraan	Torenkraan	Val van personen	3	6	15	270	Antivalharnas met dubbele vallijn indien één doorlopende kraanladder Bij verplaatsingen op de giek dubbele veiligheidslijn en/of leeflijn Toegangstrap met tussenbordessen	0.5	6	15	45
9	Beklimmen van torenkraan	Torenkraan	Uitglieden	3	6	15	270	Propere veiligheidsschoenen	0.5	6	15	45
10	Beklimmen van torenkraan	Torenkraan	Stoten waardoor kwetsuren	3	6	15	270	Veiligheidshelm	0.5	6	15	45
11	Beklimmen van torenkraan	Torenkraan	Handkwetsuren	3	6	7	126	Veiligheidshandschoenen i.f.v. weersomstandigheden	0.5	6	7	21
12	Besturen van de torenkraan	Aanslagmateriaal	Val van bouw materiaal	3	6	15	270	3-Maandelijke keuring door EDTC Aanslagmateriaal i.f.v. lasten Correct aanslaan van lasten Correcte hijshoek respecteren (niet groter dan 90°) Geen lasten hijsen boven de sanitaire voorzieningen Gekeurd aanslagmateriaal Gekwalificeerd persoon; medisch geschikt Hijszone signaleren Niet hijsen boven personen Indien nodig evenaar gebruiken Intacte veiligheidspallen aan de hijsaak Lasten in stabiele verpakking hijsen	0.5	6	15	45
13	Besturen van de torenkraan	Kraan	Val van bouw materiaal	3	6	15	270	De hijsketting in rust hangt op veilige afstand van de torenopstelling Duidelijke aanduiding hijsvermogens Hijsen van lasten i.f.v. hijskracht torenkraan	0.5	6	15	45
14	Besturen van de torenkraan	Kraan	Omvalen	3	6	15	270	Giek na arbeidstijd windvrij zetten Werk staken vanaf windkracht 6	0.5	6	15	45



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
15	Besturen van de torenkraan	Kraan	Knelling	3	6	7	126	Goede communicatie-afspraken met kraanman en rigger Na geven van hijsinstructie nooit vingers tussen kettingen	0.5	6	7	21
16	Gebruik meerdere kranen	Kraan	Botsing met kranen	3	6	15	270	Antibotsinrichting Kraanprotocol voor afspraken Radiocontact kraanbestuurders	0.5	6	15	45
17	Uitzonderlijk gebruik personenkooi	Personenkooi	Val van personen	3	6	15	270	Antivalharnas met korte veiligheidslijn Binnen het werkplatform blijven Kooi niet verlaten in gehesen positie; enkel uitstappen op begane grond Toegangspoort (indien aanwezig) vergrendelen Verankering aan aangeduid ankerpunt	0.5	6	15	45
18	Uitzonderlijk gebruik personenkooi	Personenkooi	Val van bouw materiaal	3	6	15	270	3-Maandelijkse keuring kooi met kraan door EDTC Aanduiding gewicht kooi, maximum totaal toegelaten gewicht en aantal toegelaten personen De totale belasting van het hystoestel wordt beperkt tot de helft van de maximaal toegelaten last Kooi en hijsketting moeten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Kraanhijsnelheid beperkt tot 20m/min Werk staken vanaf windkracht 6 Sluiten veiligheidspal kraanhaak	0.5	6	15	45
19	Uitzonderlijk gebruik personenkooi	Personenkooi	Knelling	3	3	7	63	Handen en voeten binnen de kooi houden Kooi is voorzien van stootveiligheid Visueel contact met bestuurder	0.2	3	7	4.2
20	Reageren op defecten	Besturing	Defecten	6	6	7	252	Gebruiksaanwijzing aanwezig in toestel (kraan) Kennis bediening nooddaling hijsrem Kennis servicenummer kraanleverancier Wekelijks kraannazicht door de kraanbestuurder	0.2	6	7	8.4



Werken met hef- en hijstoestellen

Documentcode	RA23/000007	Workflowstatus	Finaal
Versiedatum	09/02/2023	Risicoanalyseformulenaam	Kinney
Bedrijfstaak	Werken met hef- en hijstoestellen	Entiteit	
Werkpost		Bedrijfsvestiging	
Functie		Bedrijfsafdeling	
Welzijnsdomein		Project	
Beheerders	DECEUNINCK Miguel		
Omschrijving			

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Bestellen heftoestellen	Hef-hijstoestellen	Toestel niet geschikt voor gebruik	6	6	7	252	Hijjsuk bij hijsactiviteiten Keuringsverslagen Type toestel i.f.v. de ondergrond, werkbereik, lastvermogen en knellingsrisico	0.2	6	7	8.4
2	Besturen	Hef-hijstoestellen	Verlies controle	3	6	15	270	Contactsleutel bij onbemande hefwerktuigen verwijderen Gekwalificeerde bediener Kennis en opvolging werkinstructies (o.a. max. belasting, ...)	0.5	6	15	45
2	Besturen	Hef-hijstoestellen	Aanrijding	3	6	15	270	Aangepaste verlichting Respecteren interne verkeersregels Signalisatie obstakels en niveauverschillen Signalisatie werkzone Vrijhouden rijzone	0.5	6	15	45
2	Besturen	Hef-hijstoestellen	Val van personen	3	6	15	270	Verboden op vorken te staan	0.5	6	15	45
2	Besturen	Hef-hijstoestellen	Kantelen	3	6	15	270	Respecteren snelheidsbeperkingen Rijplaten Stempels Veiligheidsafstand t.o.v. putrand Werken op geschikte ondergrond	0.5	6	15	45
2	Besturen	Hef-hijstoestellen	Val van bouw materiaal	6	6	7	252	Materiaal stevig inpakken	0.2	6	7	8.4



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Zitten in bestuurscabine	Cabine	Val van personen	6	6	7	252	Cabinedeur sluiten Niemand meevoeren Veiligheidsgordel	0.2	6	7	8.4
2	Verlaten bestuurscabine	Hef-hijstoestellen	Val van personen	6	6	7	252	Gebruik treden en leuning Uit het toestel stappen: niet springen	0.2	6	7	8.4
9	Hijsen last met hijstoestel	Bouwmateriaal	Val van bouwmateriaal	6	6	7	252	Gekeurd aanslagmateriaal i.f.v. de last Gekeurd hijswerktuig en aanslagmateriaal Materiaal stevig inpakken	0.2	6	7	8.4
10	Hijsen last met hijstoestel	Bouwmateriaal	Stoten waardoor kwetturen	3	6	15	270	Begeleiden last met touw	0.5	6	15	45
11	Besturen op openbare weg	Openbare weg	Aanrijding	3	6	15	270	Aanvraag ingebruikname openbare weg Heftoestel uitgerust en verzekerd voor rijden op openbare weg Signalisatie werkzone	0.5	6	15	45
12	Werken met arbeidsmiddelen op fossiele brandstof	Brandstofgassen	Gezondheidsklachten door inademen uitlaatgassen	3	6	15	270	Ventilatie bij binnenwerk Verbod van toestellen met fossiele brandstof in besloten ruimten	0.5	6	15	45
13	Werken met arbeidsmiddelen op fossiele brandstof	Brandstofgassen	Gezondheidsklachten door inademen uitlaatgassen	3	6	15	270	Ventilatie bij binnenwerk Verbod van toestellen met fossiele brandstof in besloten ruimten	0.5	6	15	45

ALHEEMBOUW



Werken met snelmontagekraan			
Documentcode	RA23/000010	Workflowstatus	Finaal
Versiedatum	09/02/2023	Risicoanalyseformulenaam	Kinney
Bedrijfstaak	Werken met snelmontagekraan	Entiteit	
Werkpost		Bedrijfsvestiging	
Functie		Bedrijfsafdeling	
Welzijnsdomein		Project	
Beheerders	DECEUNINCK Miguel		
Omschrijving			

#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Leveren snelmontagekraan	Oplegger	Aanrijding	6	6	7	252	Begeleiding werftransport Gekwalificeerde leverancier Signalisatie obstakels en niveauverschillen Verharde rijroute i.f.v. last Voorafgaandelijke bepaling veilige rijroute	0.2	6	7	8.4
2	Plaatsen snelmontagekraan	Snelmontagekraan	Ongevallen tijdens plaatsing	3	6	15	270	Plaatsen van kraan volgens de veiligheidsrichtlijnen beschreven in de ontvangen risicoanalyse Werken met gekwalificeerde plaatsingsfirma	0.5	6	15	45
2	Plaatsen snelmontagekraan	Snelmontagekraan	Omvallen	3	6	15	270	Countergewicht i.f.v. draagvermogen Funderingsvoeten- en plaat i.f.v. kraantype	0.5	6	15	45
2	Plaatsen snelmontagekraan	Snelmontagekraan	Elektrisering tot elektrocutie	3	6	15	270	Aardingspen aanbrengen en uitmeten	0.5	6	15	45
2	Plaatsen snelmontagekraan	Snelmontagekraan	Uitvallen stroomtoevoer	3	6	15	270	Elektriciteitstoevoer i.f.v. type kraan Kennis bediening nooddaling hijsrem	0.5	6	15	45
2	Plaatsen snelmontagekraan	Snelmontagekraan	Stoten waardoor kwesturen	3	6	15	270	Draairadius snellbouwkraan signaleren	0.5	6	15	45



#	Handeling	Gevaar	Risico	W	B	E	R	Preventiemaatregelen	W	B	E	RR
2	Besturen van de snelmontagekraan	Aanslagmateriaal	Val van bouw materiaal	3	6	15	270	3-Maandelijkse keuring door EDTC Aanslagmateriaal i.f.v. lasten Correcte hijshoek respecteren (niet groter dan 90°) Gekeurd aanslagmateriaal Gekwalificeerd persoon; medisch geschikt	0.5	6	15	45
2	Besturen van de snelmontagekraan	Aanslagmateriaal	Loskomen van lasten	3	6	15	270	Correct aanslaan van lasten Geen lasten hijsen boven de sanitaire voorzieningen Hijszone signaleren Niet hijsen boven personen Intacte veiligheidspallen aan de hijschaak Lasten in stabiele verpakking hijsen	0.5	6	15	45
9	Besturen van de snelmontagekraan	Kraan	Val van bouw materiaal	3	6	15	270	De hijsketting in rust hangt op veilige afstand van de torenopstelling Duidelijke aanduiding hijsvermogens Hijsen van lasten i.f.v. hijskracht snelmontagekraan	0.5	6	15	45
10	Besturen van de snelmontagekraan	Kraan	Omvallen	3	6	15	270	Giek na arbeidstijd windvrij zetten Werk staken vanaf windkracht 6	0.5	6	15	45
11	Besturen van de snelmontagekraan	Kraan	Knelling	3	6	7	126	Goede communicatie-afspraken met kraanman en rigger Na geven van hijsinstructie nooit vingers tussen kettingen	0.5	6	7	21
12	Gebruik meerdere kranen	Kraan	Botsing met kranen	3	6	15	270	Antibotsinrichting Kraanprotocol voor afspraken Radiocontact kraanbestuurders	0.5	6	15	45
13	Reageren op defecten	Besturing	Defecten	6	6	7	252	Gebruiksaanwijzing aanwezig in toestel (kraan) Kennis bediening nooddaling hijsrem Kennis servicenummer kraanleverancier Wekelijks kraannazicht door de kraanbestuurder	0.2	6	7	8.4



Legendes		
FMEA		
K	Kans voorkomen	1: Totaal uitgesloten 2: Niet mogelijk 3: Totaal niet te verwachten 4: Niet echt te verwachten 5: Niet in te schatten 6: Mogelijk 7: Goed mogelijk 8: Zeer goed mogelijk 9: Te verwachten 10: Zeker
E	Ernst gevolg	1: Verwaarloosbaar 2: Gering 3: Minimaal 4: Erg laag 5: Laag 6: Gemiddeld 7: Hoog 8: Erg hoog 9: Zeer hoog 10: Gevaarlijk hoog
B	Beheersing Kans	1: Beheersing vrijwel zeker 2: Beheersing zeer waarschijnlijk 3: Beheersing waarschijnlijk 4: Beheersing meer dan gemiddeld 5: Beheersing gemiddeld 6: Beheersing laag 7: Beheersing erg laag 8: Beheersing onwaarschijnlijk 9: Beheersing zeer onwaarschijnlijk 10: Beheersing vrijwel uitgesloten
R/RR	Reëel risico / Restrisiko	< 125: lager dan 125 125 - 199: vanaf 125 200 - 399: vanaf 200 > 400: vanaf 400



ALHEEMBOUW

Kinney		
W	Waarschijnlijkheid	0,1: Ondenkbaar 0,2: Onmogelijk 0,5: Onwaarschijnlijk 1: Waarschijnlijk 3: Ongewoon 6: Mogelijk 10: Verwacht
B	Blootstelling	0,5: Zeldzaam 1: Jaarlijks 2: Maandelijks 3: Wekelijks 6: Dagelijks 10: Altijd
E	Ernst	1: Gering (EHBO kan nodig zijn) 3: Belangrijk (werkongeslacht) 7: Ernstig (invaliditeit) 15: Zeer ernstig (1 dode) 40: Ramp (meerdere doden)
R/RR	Reëel risico / Restrisiko	< 30: kleiner dan 30 30 - 70: tussen 30 en 70 70 - 200: tussen 70 en 200 200 - 400: tussen 200 en 400 > 400: groter dan 400

ALHEEMBOUW



ALHEEMBOUW

Alheembouw NV

Roeselarestraat 205
8840 Oostnieuwkerke
+32 (0)51 22 15 86
info@alheembouw.be

Gevaarlijke stoffen			
Gevaarlijke stof	Startdatum	Einddatum	Remark
0			



ALHEEMBOUW



ALHEEMBOUW

Alheembouw NV

Roeselarestraat 205
8840 Oostnieuwkerke
+32 (0)51 22 15 86
info@alheembouw.be

Bijlagenoverzicht

00013682-ISO9001 -QMS-NLDNL-UKAS.PDF
00014429-ISO45001 -OHSAS-ENGUS-UKAS.PDF
00014430-ISO14001 -EMS-NLDNL-UKAS.PDF



ALHEEMBOUW

Certificaat

Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

ALHEEMBOUW N.V.

Roeselarestraat 205, 8840 Oostnieuwkerke, Belgium

door LRQA is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

ISO 9001:2015

Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 00013682

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

Algemene aanneming van bouwwerken:

Industriebouw, Totaalprojecten en realisatie van PPS (publiek -private samenwerking)
en DBFM-projecten (ontwerp, bouw, financiering, onderhoud).

ALHEEMBOUW

Paul Graaf

Area Operations Manager, Europe

Afgegeven door: LRQA Limited



0001

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

ALHEEMBOW N.V.

Roeselarestraat 205, 8840 Oostnieuwkerke, Belgium

has been approved by LRQA to the following standards:

ISO 45001:2018

Approval number(s): ISO 45001 – 00014429

The scope of this approval is applicable to:

General building contractors:
Industrial construction, Overall projects and realization of PPP- (public private partnership)
and DBFM-projects (design, construction, financing, maintenance).

ALHEEMBOW

Paul Graaf

Area Operations Manager, Europe

Issued by: LRQA Limited



0001

Certificaat

Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

ALHEEMBOUW N.V.

Roeselarestraat 205, 8840 Oostnieuwkerke, Belgium

door LRQA is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

ISO 14001:2015

Goedkeuringsnummer: ISO 14001 – 00014430

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

Algemene aanneming van bouwwerken:

Industriebouw, Totaalprojecten en realisatie van PPS (publiek -private samenwerking)
en DBFM-projecten (ontwerp, bouw, financiering, onderhoud).

ALHEEMBOUW

Paul Graaf

Area Operations Manager, Europe

Afgegeven door: LRQA Limited



0001



1. WERFGEGEVENEN	4
2. GEGEVENS BETREFFENDE DE ONDERNEMING	5
3. WERFMATERIEEL	6
3.1. Werfinrichting	6
3.2. Elektrisch materiaal	7
3.3. Arbeidsmiddelen	7
3.4. Gevaarlijke producten	7
3.5. Persoonlijke beschermingsmiddelen	8
3.6. Noodvoorzieningen	8
4. PROCEDURES	9
4.1. Werfonthaal	9
4.2. Check in at work	9
4.3. Toolboxmeetings	9
4.4. Interne procedure meldingen	9
4.5. Werftoezicht	10
4.6. Projectspectifieke afspraken / procedures	10
4.7. Intentieverklaring onderaannemers	10
5. IDENTIFICATIE VAN DE CONTROLEORGANISMEN	11
6. NOODSITUATIES	12
6.1. Wat te doen bij een ernstig arbeidsongeval?	12
6.2. Wat te doen bij een milieu incident?	13
6.3. Wat te doen bij een ernstig incident?	14
6.4. Wat te doen bij een gaslek?	14
6.5. Wat te doen bij beschadiging van kabels?	15
6.6. Wat te doen bij een waterlek?	15
6.7. Wat te doen bij het opgraven van obussen (bommen)?	15
6.8. Noodnummers	16
7. RISICOANALYSE	17
